



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

OF. Nº 130/2024

Guaíba, 11 de Março de 2024.

Senhor Presidente,

Honra-nos cumprimentá-lo, na oportunidade em que respondemos ao **Ofício nº 130/2024**, desta Casa Legislativa, que nos encaminhou o **Requerimento nº 740/2023** apresentado pelo **Vereador João Caldas – PTB**.

O referido Requerimento traz os seguintes questionamentos:

- 1. Solicito o valor total gasto no asfaltamento de cada rua asfaltada com insumos da usina de asfalto da nossa cidade.**
- 2. Solicito o valor gasto separadamente de cada insumo utilizado para asfaltamento de cada rua feita pela usina de asfalto da nossa cidade.**

Solicito o valor gasto separadamente para cada rua com maquinário e mão de obra utilizada para o asfaltamento das ruas que foram realizadas por esta gestão com o material da usina de asfalto de nossa cidade.

Solicito a espessura em cm que foi colocada em cada rua asfaltada em nossa cidade com material da nossa usina de asfalto.

REQ 740/2023 - AUTORIA: Ver. Tiago Green
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 025940 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: ADF11BA6CE557916C30CE06B87616CDD





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos por meio deste, em resposta encaminhamos:

Rua Y1
Bairro Colina

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
390,00	6,71	2.616,90	303,26



Trecho: Av. Prof. João José Wust até a Av. Castelo Branco

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	2.616,90	2,47	6.463,74
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	303,26	146,20	44.336,61
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	1.730,14	1,82	3.148,85
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	15,47	4.344,20	67.188,53
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	158,30	72,70	11.508,54
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	71,87	70,00	5.031,08
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	57,62	69,00	3.975,74

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 141.653,09





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua X7
Bairro Colina

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
416,00	7,00	2.912,00	270,00



Trecho: Av. Pastor Luiz Antonio Rodrigues até a Rua N. S. de Fátima

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	2.912,00	2,47	7.192,64
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	270,00	146,20	39.474,00
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	2.916,00	1,82	5.307,12
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	13,77	4.302,86	59.250,38
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	140,94	72,70	10.246,34
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	63,99	70,00	4.479,30
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	51,30	69,00	3.539,70

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 129.489,48





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua X4 (Flávio Santana)
Bairro Colina

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
194,00	6,80	1.421,20	167,07



Trecho: Rua Neuza Goularte B. até a Av. Pastor Luiz Antonio Rodrigues

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
104/2022	SUB BASE E BASE DE BRITA GRADUADA (EXCLUSIVE TRANSPORTE)	m³	7,92	133,65	1.058,51
220/2022	TRANSPORTE DE BASE E RACHÃO	m³ x Km	199,00	2,58	513,42
220/2022	IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA COM ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	56,00	7,02	393,12
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	1.421,20	2,47	3.510,36
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	167,07	146,20	24.425,63
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	1.803,05	1,82	3.281,55
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	8,52	4.270,40	36.386,24
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	87,21	72,70	6.340,21
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	39,60	70,00	2.771,69
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	31,74	69,00	2.190,29

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 80.871,02





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua X3 (Belmiro Andriotti)
Bairro Colina

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
260,00	7,00	1.813,30	210,16



Trecho: Início da Rua até a Av. Pastor Luiz Antonio Rodrigues

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
104/2022	SUB BASE E BASE DE BRITA GRADUADA (EXCLUSIVE TRANSPORTE)	m³	26,40	133,65	3.528,36
220/2022	TRANSPORTE DE BASE E RACHÃO	m³ x Km	528,08	2,58	1.362,45
220/2022	IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA COM ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	469,00	7,02	3.292,38
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	1.813,30	2,47	4.478,85
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	210,16	146,20	30.725,39
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	2.248,72	1,82	4.092,67
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	10,72	4.302,86	46.118,74
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	109,70	72,70	7.975,45
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	49,81	70,00	3.486,55
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	39,93	69,00	2.755,20

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 107.816,04





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua X2 (Didi Pacheco)
Bairro Colina

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
306,00	7,00	2.103,40	243,77



Trecho: Rua da Roseira até a Av. Pastor Luiz Antonio Rodrigues

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS				
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	2.103,40	2,47	5.195,40
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	243,77	146,20	35.639,17
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	2.632,86	1,82	4.791,81
	MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA				
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	12,43	4.270,40	53.090,77
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	127,25	72,70	9.250,93
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	57,77	70,00	4.044,14
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	46,32	69,00	3.195,82

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 115.208,04





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua Vinte de Setembro
Bairro Centro

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
454,86	11,38	4.777,90	621,20



Trecho: Rua Gaspar Martins até a Rua São José / Rua Dr. José Montaury até a Av. Ivo Lessa Silveira

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS				
220/2022	FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0CM)	m²	4.777,90	7,49	35.786,47
220/2022	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO	m³ x Km	537,47	2,58	1.386,67
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	4.777,90	2,47	11.801,41
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	621,20	146,20	90.819,44
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	5.590,88	1,82	10.175,40
	MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA				
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	31,68	4.281,35	135.638,31
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	324,27	72,70	23.574,17
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	147,22	70,00	10.305,71
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	118,03	69,00	8.143,93

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 327.631,51





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua Sem Nome
Bairro Santa Rita

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
205,28	9,50	1.950,16	180,80



Trecho: Av. Osvaldo Jardim até a Av. João A. Gonzales

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	1.950,16	2,47	4.816,90
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	180,80	146,20	26.432,96
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	2.893,10	1,82	5.265,44
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	9,22	4.270,40	39.376,50
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	94,38	72,70	6.861,25
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	42,85	70,00	2.999,47
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	34,35	69,00	2.370,29

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 88.122,81

...





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua Salustiano Avelino Ribeiro
Bairro Colina

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
190,00	8,90	1.691,00	195,98



Trecho: Av. Lourival Luiz da Cunha até a Rua Mauricio S. Sobrinho

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	1.691,00	2,47	4.176,77
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	195,98	146,20	28.652,28
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	2.195,05	1,82	3.994,99
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	9,99	4.302,86	43.007,00
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	102,30	72,70	7.437,32
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	46,45	70,00	3.251,31
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	37,24	69,00	2.569,30

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 93.088,97






PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua Rui Barbosa
Bairro Florida

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
405,72	7,40	3.002,33	487,15

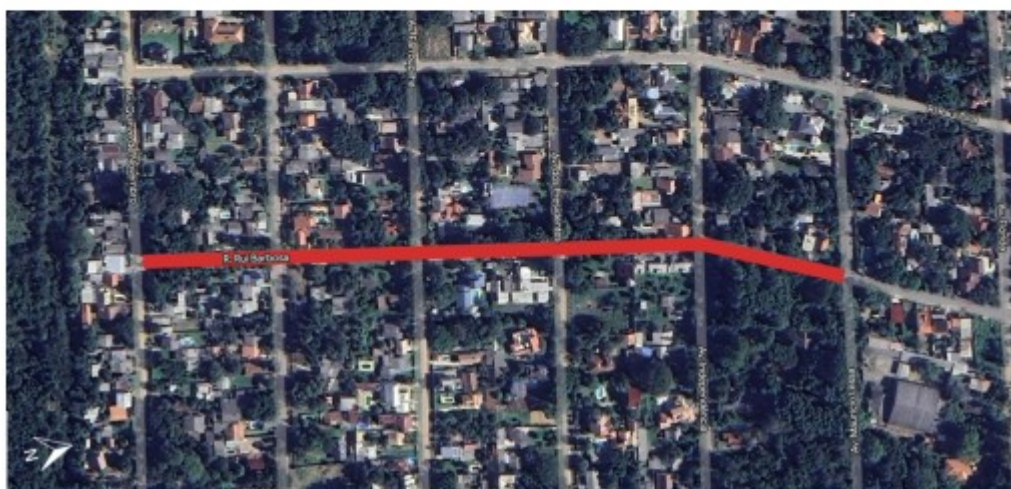

Trecho: Av. Mauricio Lessa até a Rua Fernando Mendes Ribeiro

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	3.002,33	2,47	7.415,76
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	487,15	146,20	71.221,33
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	2.094,75	1,82	3.812,45
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	24,84	4.344,20	107.930,13
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	254,29	72,70	18.487,05
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	115,45	70,00	8.081,82
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	92,56	69,00	6.386,54

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 223.335,06





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua Quinze
Bairro Santa Rita

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
126,23	5,50	694,26	80,45



Trecho: Início na Rua Jorge de Matos Saviedra até o final da rua

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	694,26	2,47	1.714,82
104/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	80,45	145,56	11.710,30
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	1.295,37	1,82	2.357,57
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	4,10	4.270,40	17.521,24
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	41,99	72,70	3.053,03
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	19,07	70,00	1.334,67
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	15,29	69,00	1.054,70

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 38.746,33





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua Prof. Wilson Larré Pereira
Bairro Colina

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
168,00	6,80	1.142,40	132,40



Trecho: Divisa ULBRA até a Av. Pastor Luiz Antonio Rodrigues

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	1.142,40	2,47	2.821,73
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	132,40	146,20	19.356,88
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	1.482,92	1,82	2.698,91
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	6,75	4.302,86	29.054,63
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	69,11	72,70	5.024,50
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	31,38	70,00	2.196,52
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	25,16	69,00	1.735,76

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 62.888,93

..





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua Pernambuco
Bairro Colina

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
260,80	8,05	2.099,44	340,61



Trecho: Rua Rio Grande do Norte até a Rua Maurício S. Sobrinho

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
220/2022	FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0CM)	m²	2.099,43	7,49	15.724,73
220/2022	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO	m³ x Km	512,45	2,58	1.322,12
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	2.099,43	2,47	5.185,59
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	340,61	146,20	49.797,18
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	3.065,88	1,82	5.579,90
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	17,37	4.281,35	74.371,80
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	177,80	72,70	12.925,95
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	80,72	70,00	5.650,72
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	64,72	69,00	4.465,40

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 175.023,39






PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua Pará
Bairro Coronel Nassuca

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
473,00	8,50	4.020,50	465,96

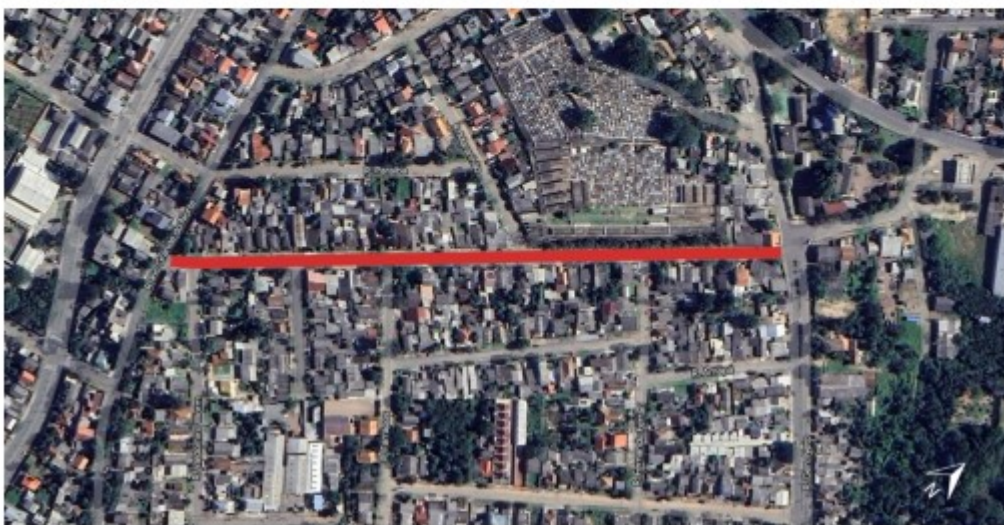

Trecho: Rua Rio Grande do Norte até a Rua Gen. Neto

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS				
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	4.020,50	2,47	9.930,64
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	465,96	146,20	68.123,35
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	3.165,08	1,82	5.760,45
	MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA				
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	23,76	4.344,20	103.235,40
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	243,23	72,70	17.682,90
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	110,43	70,00	7.730,28
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	88,53	69,00	6.108,74

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 218.571,74

..





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua Maurício Sirotsky Sobrinho
Bairro Colina

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
960,87	8,41	6.786,15	943,79



Trecho: Rua Pernambuco até a Rua C9

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
220/2022	FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0CM)	m²	6.786,15	7,49	50.828,26
220/2022	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO	m³ x Km	1.416,67	2,58	3.655,01
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	6.786,15	2,47	16.761,79
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	943,79	146,20	137.982,10
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	8.022,44	1,82	14.600,84
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	48,13	4.281,35	206.075,46
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	492,66	72,70	35.816,26
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	223,68	70,00	15.657,48
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	179,32	69,00	12.373,09

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 493.750,29

..





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua Cel. Manoel Rodrigues Filho
Bairro Centro

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
183,50	13,24	2.429,21	337,84



Trecho: Av. Sete de Setembro até o final da rua

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
220/2022	FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0CM)	m²	2.429,21	7,49	18.194,78
220/2022	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO	m³ x Km	546,57	2,58	1.410,15
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	2.429,21	2,47	6.000,15
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	337,84	146,20	49.392,21
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	3.040,69	1,82	5.534,06
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	17,23	4.281,35	73.766,98
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	176,35	72,70	12.820,83
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	80,07	70,00	5.604,77
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	64,19	69,00	4.429,08

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 177.152,99

...





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua Coronel Inácio de Quadros
Bairro Ermo

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
856,42	8,00	8.028,24	1.005,55



Trecho: Av. Dona Frutuosa até a Rotatória Evaristo Lopes

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
220/2022	SUB BASE E BASE DE BRITA GRADUADA (EXCLUSIVE TRANSPORTE)	m³	188,51	143,57	27.064,38
220/2022	REFORÇO DO SUBLEITO COM RACHÃO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	271,21	130,31	35.341,38
220/2022	TRANSPORTE DE BASE E OU SUB BASE DE BRITA GRADUADA	m³ x Km	13362,7	2,58	34.475,77
220/2022	FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0CM)	m²	7.736,84	7,49	57.948,93
220/2022	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO	m³ x Km	1.239,78	2,58	3.198,63
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	8.028,24	2,47	19.829,75
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	1005,55	146,20	147.011,41
220/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	7.778,68	1,89	14.701,71
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	51,28	4.281,35	219.560,69
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	524,90	72,70	38.160,02
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	238,32	70,00	16.682,07
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	191,05	69,00	13.182,76

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 627.157,49

REQ 740/2023 - AUTORIA: Ver. Tiago Green
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 025940 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: ADF11BA6CE557916C30CE06B87616CDD





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua General Neto
Bairro Coronel Nassuca

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
729,67	7,00	4.529,82	419,81



Trecho: Rua Noé Pinhatti até a Rua Cel. Inácio de Quadros

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	4.529,82	2,47	11.188,66
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	419,81	146,20	61.376,22
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	3.163,11	1,82	5.756,86
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	21,41	4.344,20	93.010,67
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	219,14	72,70	15.931,54
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	99,49	70,00	6.964,65
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	79,76	69,00	5.503,71

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 199.732,30





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua Fernando Ferrari
Bairro Coronel Nassuca

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
194,00	8,00	1.552,00	179,87



Trecho: Rua Pará até a Rua Maneca Paiva

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	1.552,00	2,47	3.833,44
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	179,87	146,20	26.296,99
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	9,17	4.344,20	39.850,95
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	93,89	72,70	6.825,96
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	42,63	70,00	2.984,04
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	34,18	69,00	2.358,10

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 82.149,49





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua Dezoito
Bairro Santa Rita

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
254,56	5,50	1.400,10	162,23



Trecho: Rua Sem Nome até a Rua Jorge de Matos Savedra

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	1.400,10	2,47	3.458,25
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	162,23	146,20	23.718,03
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	2.612,00	1,82	4.753,84
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	8,27	4.270,40	35.332,14
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	84,68	72,70	6.156,53
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	38,45	70,00	2.691,40
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	30,82	69,00	2.126,84

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 78.237,01

..





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua Dezessete
Bairro Santa Rita

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
251,00	5,50	1.380,50	127,98



Trecho: Rua Sem Nome até a Rua Jorge de Matos Savedra

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	1.380,50	2,47	3.409,84
104/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	127,98	145,56	18.628,77
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	2.035,18	1,82	3.704,03
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	6,53	4.270,40	27.872,82
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	66,81	72,70	4.856,76
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	30,33	70,00	2.123,19
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	24,32	69,00	1.677,82

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 62.273,22





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua Dezesseis
Bairro Santa Rita

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
124,79	5,50	709,65	79,53



Trecho: Rua Sem Nome até a Rua Jorge de Matos Savedra

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	709,65	2,47	1.752,84
104/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	79,53	145,56	11.576,39
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	1.272,48	1,82	2.315,91
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	4,06	4.270,40	17.320,87
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	41,51	72,70	3.018,12
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	18,85	70,00	1.319,40
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	15,11	69,00	1.042,64

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 38.346,16





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua Davino Teixeira
Bairro Colina

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
147,80	6,95	1.027,21	166,66



Trecho: Rua Argemiro Dorneles até a Rua Cezar Verdi

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	1.027,21	2,47	2.537,21
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	166,66	146,20	24.365,69
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	1.133,39	1,82	2.062,77
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	8,50	4.281,35	36.390,02
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	87,00	72,70	6.324,65
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	39,50	70,00	2.764,89
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	31,67	69,00	2.184,91

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 76.630,14





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua Cinquenta e Nove
Bairro Santa Rita

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
215,80	7,00	1.510,60	175,07



Trecho: Av. João Arnaldo Gonzales até a Av. Valdir Rodrigues S.

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	1.510,60	2,47	3.731,18
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	175,07	146,20	25.595,23
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	2.958,82	1,82	5.385,05
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	8,93	4.270,40	38.128,57
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	91,39	72,70	6.643,80
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	41,49	70,00	2.904,41
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	33,26	69,00	2.295,17

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 84.683,41





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua Cezar Verdi
Bairro Colina

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
194,00	7,00	1.358,00	157,39



Trecho: Av. Lourival Luiz da Cunha até a Rua Mauricio S. Sobrinho

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	1.358,00	2,47	3.354,26
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	157,39	146,20	23.010,42
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	1.762,79	1,82	3.208,28
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	8,03	4.302,86	34.538,58
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	82,16	72,70	5.972,86
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	37,30	70,00	2.611,10
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	29,90	69,00	2.063,38


INVESTIMENTO TOTAL R\$ 74.758,88

..





EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
128,30	6,80	872,44	101,11



PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS				
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	872,44	2,47	2.154,93
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	101,11	146,20	14.782,28
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	1.132,49	1,82	2.061,13
	MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA				
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	5,16	4.302,86	22.188,17
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	52,78	72,70	3.837,06
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	23,96	70,00	1.677,41
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	19,21	69,00	1.325,55

□ □





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua Argemiro Dorneles
Bairro Colina

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
139,70	7,10	991,87	160,93



Trecho: Av. Vasco Alves Pereira até a Av. Lourival Luiz da Cunha

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
104/2022	SUB BASE E BASE DE BRITA GRADUADA (EXCLUSIVE TRANSPORTE)	m³	45,36	133,65	6.062,36
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	991,87	2,47	2.449,92
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	160,93	146,20	23.527,97
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	1.448,46	1,82	2.636,20
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	8,21	4.281,35	35.138,88
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	84,01	72,70	6.107,20
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	38,14	70,00	2.669,83
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	30,58	69,00	2.109,79

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 80.702,14





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua Amapá
Bairro Coronel Nassuca

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
120,00	7,80	936,00	108,48



Trecho: Rua Fernando Ferrari até a Rua Gen. Neto

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	936,00	2,47	2.311,92
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	108,48	146,20	15.859,78
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	824,45	1,82	1.500,50
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	5,53	4.344,20	24.034,20
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	56,63	72,70	4.116,75
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	25,71	70,00	1.799,68
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	20,61	69,00	1.422,17

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 51.045,00

..






PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua Adão Rabelo César
Bairro Jardim Iolanda

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
445,14	7,56	3.288,41	87,22

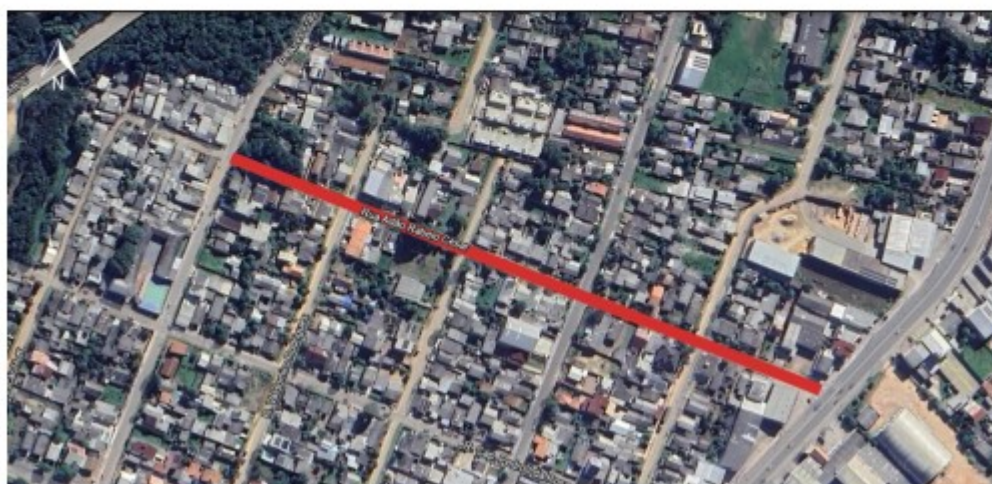

Trecho: Av. Adão Foques até a Rua Aires Fraga

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
104/2022	SUB BASE E BASE DE BRITA GRADUADA (EXCLUSIVE TRANSPORTE)	m³	493,26	133,65	65.924,20
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	752,69	2,47	1.859,14
220/2022	IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA COM ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	752,69	7,02	5.283,88
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	87,22	146,20	12.751,56
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	662,89	1,82	1.206,46
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	4,45	4.681,00	20.822,12
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	45,53	72,70	3.309,95
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	20,67	70,00	1.446,98
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	16,57	69,00	1.143,45

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 113.747,75






PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Av. Sete de Setembro
Bairro Centro

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
680,65	15,00	10.230,00	1.188,11

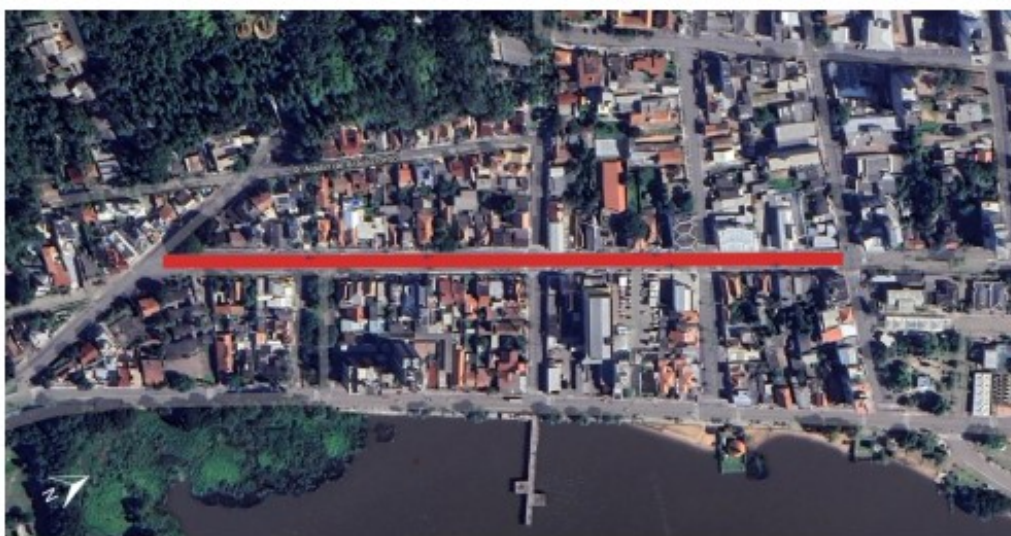

Trecho: Rua São José até a Rua Cel. Manoel Rodrigues Filho

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
220/2022	FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0CM)	m²	10.230,00	7,49	76.622,70
220/2022	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO	m³ x Km	2.301,50	2,58	5.937,87
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	10.230,00	2,47	25.268,10
220/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	1.188,11	146,20	173.701,68
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	10.694,48	1,82	19.463,95
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	60,59	4.281,35	259.422,45
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	620,19	72,70	45.088,06
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	281,58	70,00	19.710,74
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	225,74	69,00	15.576,12

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 640.791,69





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Rua Treze
Bairro Santa Rita

EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	MASSA ASFÁLTICA (ton)
237,00	5,50	1.303,49	151,03



Trecho: Início na Rua Jorge de Matos Saveria até o final da rua

INVESTIMENTO:

PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
220/2022	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO)	m²	1.303,49	2,47	3.219,62
104/2022	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXCLUSIVE MATERIAL)	T	151,03	145,56	21.983,93
104/2022	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T x Km	2.416,64	1,82	4.398,28
MATERIAIS - PRODUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA					
005/2023	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70 - (5,10%)	T	7,70	4.270,40	32.892,88
005/2023	Pó de Pedra - (52,20%)	T	78,84	72,70	5.731,50
005/2023	Pedrisco - (23,70%)	T	35,79	70,00	2.505,59
005/2023	Brita 3/4 - (19,00%)	T	28,70	69,00	1.980,00

INVESTIMENTO TOTAL R\$ 72.711,80

Contando com a costumeira atenção e colaboração. Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Marcelo Soares Reinaldo
Prefeito Municipal

Ao
Exmo. Srº,
João Caldas
M. D. Presidente da Câmara Municipal – Guaíba/RS

REQ 740/2023 - AUTORIA: Ver. Tiago Green
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 025940 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: ADF11BA6CE557916C30CE06B87616CDD

